Darum ist das Thema relevant



Eine sachlich gute **Reorganisation** – die Neuordnung von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen – setzt sich nicht von selbst durch. Beschäftigte können Gründe verstehen und dennoch Sorgen um Rolle, Belastung, Kompetenz oder Status haben. **Widerstand** kann offen auftreten, etwa als Ablehnung, oder verdeckt, etwa durch Verzögerung, Rückzug oder Festhalten am alten Prozess. Er ist nicht automatisch irrational: Oft weist er auf reale Informations-, Beteiligungs- oder Umsetzungsprobleme hin.


Change Management gestaltet betriebliche Veränderungen und verbindet Zielklärung, Kommunikation, Beteiligung, Qualifizierung, **Führung**, Pilotierung (Erprobung im begrenzten Rahmen), Feedback (Rückmeldung) und Verstetigung (Überführung bewährter Abläufe in den Regelbetrieb). Agiles Vorgehen bedeutet dabei nicht planloses Ausprobieren, sondern kurze überprüfbare Schritte mit klaren Leitplanken und Anpassung. Ein **Maßnahmenplan** übersetzt diese Logik in konkrete Verantwortlichkeiten, Termine, Wirkungen und Nachweise.

Das Format kann im Abitur 2027 verlangt werden. Entscheidend ist, dass Maßnahmen nicht nur gesammelt, sondern aus Ist-Analyse und Zielsetzung begründet werden. Die Ist-Analyse beschreibt den gegenwärtigen Zustand anhand von Fakten; das Ziel benennt den angestrebten Zustand.

Kompetenzprofil

Vorrangige Kompetenz · Fachkompetenz

Ich kann Ursachen und Formen von Widerstand analysieren, Instrumente des Change Managements und agile Vorgehensweisen beurteilen und zu einem tragfähigen Veränderungsprozess verbinden.



Personalkompetenz

Ich kann Unsicherheit und Kritik als Teil von Veränderung aushalten, eigene Annahmen revidieren und Verantwortung für einen anpassungsfähigen Umsetzungsweg übernehmen.

Sozialkompetenz

Ich kann unterschiedliche Stakeholderinteressen, Widerstände und Beteiligungsbedarfe ernst nehmen und daraus abgestimmte Kommunikations-, Qualifizierungs- und Beteiligungsmaßnahmen entwickeln.

Methodenkompetenz

Ich kann aus Ist-Analyse und Zielsetzung einen strukturierten Maßnahmenplan mit begründeten Aktionen, Verantwortlichkeiten, Umsetzung, Wirkung und Erfolgskontrolle entwickeln.

Medienkompetenz

Ich kann digitale Kommunikations-, Lern- und Feedbackwerkzeuge sowie Workflow-Werkzeuge zur digitalen Steuerung von Arbeitsabläufen zielgerichtet in einen Changeprozess integrieren und ihre Daten verantwortungsvoll für Lernen statt Überwachung nutzen.

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Handlungssituation



Nach der Verhandlung in LS 09 einigen sich Geschäftsführung und **Betriebsrat**, die gewählte Interessenvertretung der Beschäftigten, auf einen sechsmonatigen Order-to-Delivery-Pilot ab 15. Juni 2027. Order-to-Delivery bezeichnet den Ablauf vom Auftragseingang bis zur Auslieferung; im Pilot wird der neue Ablauf zunächst in einem begrenzten Bereich erprobt. Die Vereinbarung regelt Zweckbindung der Prozessdaten (Nutzung nur für die vereinbarten Zwecke), Schulung in **Arbeitszeit**, Rückkehrrechte, Belastungskontrolle, unabhängige Qualitätsfreigabe und eine gemeinsame Evaluation, also die systematische Auswertung von Ablauf und Ergebnissen. Kündigungen oder Entgeltkürzungen sind nicht vorgesehen.

Trotzdem gerät die Vorbereitung ins Stocken. Von 60 Teilnehmenden einer Kurzbefragung unterstützen 19 den Pilot, 25 sind unentschieden und 16 skeptisch. Einige Beschäftigte verstehen den Nutzen, fürchten aber zusätzliche Arbeit im Parallelbetrieb. Andere bezweifeln, dass die Gründer Entscheidungsrechte tatsächlich abgeben. Eine Teamleitung sieht durch den Prozessowner, die für den gesamten Ablauf verantwortliche Person, Statusverlust. Zwei erfahrene Lagerkräfte vermeiden die WMS-Schulung mit dem Hinweis, das alte System habe bisher funktioniert. WMS steht für Warehouse Management System, eine Software zur Steuerung und Dokumentation von Lagerabläufen. Im Kundenservice entstehen dagegen hohe Erwartungen, die neue Struktur werde sofort alle Verzögerungen lösen.

Christian möchte eine große Kick-off-Veranstaltung als gemeinsamen Projektauftakt, verpflichtende Schulung und anschließenden Start. Julia hält das für zu kommunikationslastig. Aluna schlägt kurze Pilotzyklen, sichtbare Problemboards – gemeinsame Übersichten offener Probleme – und wöchentliche Retrospektiven zur Verbesserung der Zusammenarbeit vor. Fari fordert geschützte Lernzeit und eine Kultur, in der Fehler im Pilot nicht automatisch einzelnen Personen zugerechnet werden. Der Betriebsrat verlangt, dass Rückmeldungen nicht nur gesammelt, sondern mit nachvollziehbarer Entscheidung beantwortet werden.

Der Change-Lenkungskreis, das Gremium für richtungsweisende Entscheidungen und Ressourcenfreigaben, benötigt einen **Maßnahmenplan**, der unterschiedliche Widerstandsursachen adressiert, den Pilot arbeitsfähig macht und nach sechs Monaten eine belastbare Verstetigungsentscheidung ermöglicht. Ein schneller zentraler Rollout (Einführung des neuen Ablaufs in allen vorgesehenen Bereichen), ein beteiligungsintensiver agiler Pilot und ein stärker qualifizierungsorientiertes Stufenmodell besitzen jeweils Vorteile; ein guter Plan darf sie begründet verbinden, ohne alles gleichzeitig zu versprechen.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

1. Sachverhalt

Warum reicht eine einzige Kommunikationsmaßnahme im Fall kaum aus?

- ◯ Die Beschäftigten nennen unterschiedliche Sorgen, Lernbedarfe und Erwartungen.
- ◯ Alle Beschäftigten lehnen den Pilot aus demselben fachlichen Grund vollständig ab.

- ◯ Alle Beschäftigten erwarten identische Maßnahmen und sehen keinerlei Belastung.

2. Auswertung

Welche Vereinbarung gilt bereits für den Pilot?

- ◯ Schulungen finden nur außerhalb der Arbeitszeit und ohne Rückkehrrechte statt.
- ◯ Schulung in Arbeitszeit, Rückkehrrechte und Belastungskontrolle sind vorgesehen.
- ◯ Prozessdaten dürfen ohne Zweckbindung dauerhaft zur Einzelkontrolle genutzt werden.

3. Einordnung

Was soll der Maßnahmenplan für den Lenkungskreis ermöglichen?

- ◯ Alle Veränderungsmaßnahmen gleichzeitig starten und ohne spätere Prüfung ausrollen.
- ◯ Nur eine Auftaktveranstaltung planen und Widerstände erst nach dem Pilot besprechen.
- ◯ Widerstände bearbeiten, den Pilot gestalten und die spätere Entscheidung vorbereiten.

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Informieren

Lesen Sie vor dem Fachbegriffscheck auch M6, insbesondere die Erklärung von Schicht-Huddle und Retrospektive.

1 Einzelarbeit

Analysieren Sie M1 und M2.

Unterscheiden Sie sachlich-rationale, emotionale, identitätsbezogene und statusbezogene Widerstandsursachen nach M3.

Berechnen Sie aus M2 die Anteile der unterstützenden, unentschiedenen und skeptischen Personen an allen 60 Antwortenden.

Runden Sie auf eine Nachkommastelle, **prüfen** Sie die Summe und **erläutern** Sie mögliche Rundungsabweichungen.

 Lehrbuch · Change Management S. 181

Identifizieren Sie außerdem unrealistische positive Erwartungen.

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 40 Minuten

2 Einzelarbeit

Werten Sie M3 bis M6 aus.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

Arbeiten Sie verbindliche Leitplanken, Stakeholdermacht/-betroffenheit, Zeit- und Kapazitätsgrenzen heraus.

 Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 40 Minuten

3 Einzelarbeit

Ordnen Sie die Erfahrungen aus M8 möglichen Ursachen für das Scheitern früherer Veränderungen zu.

Vermeiden Sie die Schlussfolgerung „mehr Kommunikation löst alles“.

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Planen

4 Gruppenarbeit

Strukturieren Sie den Changeprozess in Vorbereitung, Befähigung, Pilotzyklen, Evaluation und Verstetigung.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

5 Gruppenarbeit

Legen Sie Ziele/Kennzahlen fest.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

6 Gruppenarbeit

Planen Sie funktionale Verantwortung für Projektleitung, Führung, HR (Personalbereich)/Lernen, IT (Informationstechnik)/Daten, Betriebsrat und Change Agents. Jede Maßnahme benötigt Übergaben und Rückkopplung: Rückmeldungen aus der Umsetzung müssen in die nächsten Entscheidungen einfließen.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Entscheiden

7 Gruppenarbeit

Priorisieren Sie Maßnahmen unter den Ressourcen aus M5.

Rechnen Sie M5 aus: Wie viele bezahlte Schulungsstunden stehen pro Kalenderwoche zur Verfügung?

Wie viele IT-Personentage sind einschließlich Vorbereitung für sechs Pilotmonate eingeplant?

Wie viele FTE werden insgesamt für Projektleitung und Change Agents freigestellt?

Berechnen Sie anschließend den Schulungsbedarf Ihres LS10-Plans je Kalenderwoche.

Übernehmen Sie die LS05-Belegung aus Ihrem Vorprodukt; ohne LS05-Vorprodukt begründen und **dokumentieren** Sie eine vorläufige Annahme.

Rechnen Sie: Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10.

Weisen Sie Reserve oder Überlastung aus und **kennzeichnen** Sie die Reservierung bis zum Abgleich beider Pläne als vorläufig.

Prüfen Sie IT-Aufwand und FTE-Freistellung getrennt in den zugehörigen Einheiten. FTE-Freistellung und Schulungskapazität dürfen nicht doppelt als zusätzliches Personal gezählt werden.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 30 Minuten

8 Gruppenarbeit

Entscheiden Sie, welche Aktivitäten vor dem Start zwingend, welche im Pilot iterativ (in wiederholten Erprobungs- und Verbesserungsrunden) und welche erst zur Verstetigung sinnvoll sind.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 20 Minuten

9 Gruppenarbeit

Legen Sie Stop-/Anpassungskriterien fest.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 15 Minuten

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Durchführen

10 Gruppenarbeit

Erstellen Sie den Maßnahmenplan nach M7.

Verknüpfen Sie jede Maßnahme mit einem konkreten Befund und einer erwarteten Wirkung.

 Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 45 Minuten

11 Gruppenarbeit

Entwickeln Sie für mindestens vier Stakeholder passende Kommunikation/Beteiligung, ohne widersprüchliche Botschaften.

 Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 20 Minuten

Verbindliches Handlungsergebnis: Maßnahmenplan

Erstellen Sie einen **Maßnahmenplan „Order-to-Delivery-Change 2027“**.

Er muss enthalten:

- Thema und Bezug zur Ausgangssituation,
- verdichtete Ist-Analyse mit Fakten und Widerstandsursachen,
- klare, messbare Zielsetzung,
- begründete Maßnahmen mit **Was – Wer – Wie – Wann**,
- erwartete Wirkung und Nachweis der Zielerreichung,
- Stakeholder-/Widerstandsbezug jeder Maßnahme,
- Kommunikation, Beteiligung, Qualifizierung, **Führung**, Pilotsteuerung und Verstetigung,
- Risiken, Abhängigkeiten und Anpassungs-/Stopppunkte,
- verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Daten.

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Bewerten

12 Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

Führen Sie eine Lenkungskreis-Simulation durch.

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

13 Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

Prüfen Sie Plan auf Vollständigkeit, Ressourcenrealismus, Wechselwirkungen, Beschäftigtenbeteiligung, Datenverantwortung und Messbarkeit. Die Lehrkraft gibt fachliche Rückmeldung zum Change-Zusammenhang.

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

14 Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

Überarbeiten Sie Maßnahmen, die nur Aktivität, aber keine plausible Wirkung zeigen.

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Reflektieren

15 Einzelarbeit

Benennen Sie einen Widerstand, den Ihr Plan produktiv bearbeiten soll.

Ordnen Sie ihn einer konkreten Ursache und einer betroffenen Gruppe zu.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

16 Einzelarbeit

Erklären Sie an diesem Widerstand, wie Ihre Maßnahme wirkt und woran Sie eine Verbesserung erkennen würden.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

17 Einzelarbeit

Schließen Sie mit Kompetenzselbsteinschätzung und Netzdiagramm ab.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

Kompetenzen für die Selbsteinschätzung

Fachkompetenz: Ich kann Ursachen und Formen von Widerstand analysieren, Instrumente des Change Managements und agile Vorgehensweisen beurteilen und zu einem tragfähigen Veränderungsprozess verbinden.

Personalkompetenz: Ich kann Unsicherheit und Kritik als Teil von Veränderung aushalten, eigene Annahmen revidieren und Verantwortung für einen anpassungsfähigen Umsetzungsweg übernehmen.

Sozialkompetenz: Ich kann unterschiedliche Stakeholderinteressen, Widerstände und Beteiligungsbedarfe ernst nehmen und daraus abgestimmte Kommunikations-, Qualifizierungs- und Beteiligungsmaßnahmen entwickeln.

Methodenkompetenz: Ich kann aus Ist-Analyse und Zielsetzung einen strukturierten Maßnahmenplan mit begründeten Aktionen, Verantwortlichkeiten, Umsetzung, Wirkung und Erfolgskontrolle entwickeln.


Medienkompetenz: Ich kann digitale Kommunikations-, Lern- und Feedbackwerkzeuge sowie Workflow-Werkzeuge zur digitalen Steuerung von Arbeitsabläufen zielgerichtet in einen Changeprozess integrieren und ihre Daten verantwortungsvoll für Lernen statt Überwachung nutzen.

1 = noch nicht · 2 = mit deutlicher Unterstützung · 3 = teilweise / mit Hilfen · 4 = selbstständig und sicher · 5 = sicher, begründet und übertragbar

Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

1 = noch nicht · **2** = mit deutlicher Unterstützung · **3** = teilweise / mit Hilfen · **4** = selbstständig und sicher · **5** = sicher, begründet und übertragbar.

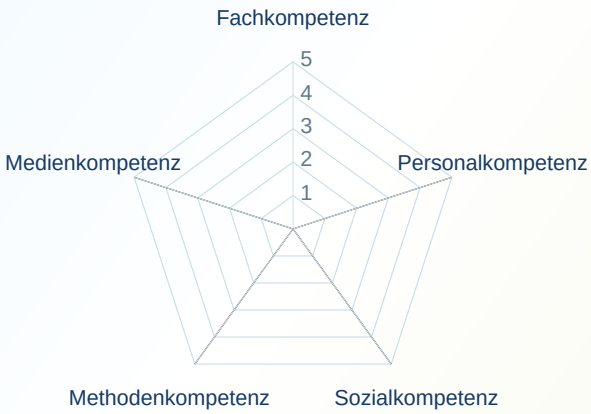

Das Netz zeigt deine Einschätzung nach der Lernsituation. Offene Werte werden nicht als Null dargestellt. Ergänze zu deinen Werten einen kurzen Arbeitsbeleg.

Fachkompetenz
LG05-LS10-F

Ich kann Ursachen und Formen von Widerstand analysieren, Instrumente des Change Managements und agile Vorgehensweisen beurteilen und zu einem tragfähigen Veränderungsprozess verbinden.

Einschätzung (1–5)

Noch offen

Beleg aus deiner Arbeit

Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Personalkompetenz
LG05-LS10-P

Ich kann Unsicherheit und Kritik als Teil von Veränderung aushalten, eigene Annahmen revidieren und Verantwortung für einen anpassungsfähigen Umsetzungsweg übernehmen.

Einschätzung (1–5)

Noch offen

Beleg aus deiner Arbeit

Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Sozialkompetenz
LG05-LS10-S

Ich kann unterschiedliche Stakeholderinteressen, Widerstände und Beteiligungsbedarfe ernst nehmen und daraus abgestimmte Kommunikations-, Qualifizierungs- und Beteiligungsmaßnahmen entwickeln.

Einschätzung (1–5)

Noch offen

Beleg aus deiner Arbeit

Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Methodenkompetenz
LG05-LS10-M

Ich kann aus Ist-Analyse und Zielsetzung einen strukturierten Maßnahmenplan mit begründeten Aktionen, Verantwortlichkeiten, Umsetzung, Wirkung und Erfolgskontrolle entwickeln.

Einschätzung (1–5)

Noch offen

Beleg aus deiner Arbeit

Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Medienkompetenz
LG05-LS10-D

Ich kann digitale Kommunikations-, Lern-, Workflow- und Feedbackwerkzeuge zielgerichtet in einen Changeprozess integrieren und ihre Daten verantwortungsvoll für Lernen statt Überwachung nutzen.

Einschätzung (1–5)

Noch offen

Beleg aus deiner Arbeit

Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Fremdfeedback getrennt dokumentieren

Rückmeldung, gebende Person und Datum:

Höchstens 255 Zeichen

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat

●●● **Adobe Acrobat Reader** Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat — □ ×

Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

BioCasa GmbH · M1 · Interne Arbeitsunterlage

Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat

Geschäftsführung (GF) und Betriebsrat an die Pilotbeteiligten · Vereinbarungsstand 17.05.2027. Der Pilot läuft vom **15.06. bis 15.12.2027**.

Bereich	Vereinbarte Leitplanke
Beschäftigung	Keine Kündigungen oder Entgeltkürzungen
Rollenwechsel	Sechs befristete Wechsel mit Rückkehrrecht: Die Beschäftigten können in ihre bisherige Rolle zurückkehren
Schulungen	In bezahlter Arbeitszeit; für Schicht- und Teilzeitkräfte zugänglich
Datennutzung	Prozessverbesserung und Rückverfolgbarkeit; keine individuelle Leistungsbewertung
Zugriff / Reporting (Berichterstattung)	Personenbezogener Zugriff nur dokumentiert zur Fehlerklärung; regelmäßige Berichte aggregiert, also auf Gruppen- oder Prozessebene zusammengefasst statt als Personenliste
Qualität	Unabhängige Qualitätsfreigabe: Die zuständige Qualitätsstelle prüft und bestätigt die Einhaltung der Qualitätsanforderungen; Zeitdruck ersetzt ihre Freigabe nicht
Gesundheit	Gefährdungs- und Belastungscheck
Steuerung	Gemeinsames Monatsreview, also eine regelmäßige Prüfung von Ergebnissen, Risiken und weiteren Schritten; Stopp oder Anpassung bei Qualitäts-, Gesundheits- oder Datenschutzrisiken

Die Vereinbarung enthält verbindliche Grenzen für den Maßnahmenplan. Ein einzelnes Instrument, etwa ein Dashboard als übersichtliche Anzeige wichtiger Kennzahlen, ersetzt diese Regeln nicht.
BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Change-Puls und Widerstandsstimmen

●●● **SAP S/4HANA** Change-Puls und Widerstandsstimmen — □ ×

Zurück · Sichern · Weitere 100 %

BioCasa GmbH · M2 · Interne Arbeitsunterlage

Change-Puls und Widerstandsstimmen

Stimmung in der Kurzbefragung

Es liegen **60 gültige Antworten** vor. Jede Person hat genau eine der drei Haltungen gewählt.

Haltung	Anzahl Antworten	Anteil · selbst berechnen
Unterstützend	19	_____ %
Unentschieden	25	_____ %
Skeptisch	16	_____ %

Anteil in % = (Anzahl der Antworten in der Gruppe ÷ 60) × 100

Runden Sie die Anteile auf eine Nachkommastelle. Durch Rundung kann die Summe geringfügig von 100 % abweichen.

Häufige Fragen und Sorgen

Hier waren Mehrfachnennungen erlaubt. Eine Person konnte mehrere Themen markieren.

Thema	Nennungen
Zusatzbelastung	46
Rollenklarheit	39
Datenverwendung	35
Qualifikation	28
Nutzen / Kunde	22
Status / Einfluss	14

Fünf anonymisierte Stimmen

- „Doppelte Arbeit.“
- „Entscheidungsrechte werden doch wieder hochgezogen.“
- „Ich schaffe die Software nicht.“
- „Meine Erfahrung zählt künftig weniger.“
- „Endlich ein Ansprechpartner pro Auftrag.“

Skepsis hat unterschiedliche Ursachen. Ordnen Sie die Stimmen begründet ein und achten Sie auch auf unrealistische positive Erwartungen.

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Change-Instrumente und agile Pilotlogik

BioCasa GmbH · M3 · Interne Arbeitsunterlage

Change-Instrumente und agile Pilotlogik

Personal- und Organisationsentwicklung an das Planungsteam · Arbeitsstand Mai 2027. Change Management gestaltet die Veränderung von Menschen, Strukturen und Arbeitsabläufen gemeinsam.

Widerstandsursachen unterscheiden

Ursache	Woran sie sich zeigen kann
Sachlich-rationaler Widerstand	Bedenken wegen fachlicher Probleme oder nachvollziehbarer betrieblicher Folgen
Emotionaler Widerstand	Unsicherheit, Angst oder fehlendes Vertrauen in die eigene Bewältigung
Identitätsbezogener Widerstand	Sorge um Zugehörigkeit, Anerkennung oder berufliches Selbstbild
Statusbezogener Widerstand	Befürchteter Verlust von Einfluss, Position oder Entscheidungsmacht

Die Kategorien beschreiben mögliche Ursachen, keine festen Persönlichkeitstypen. Eine Person kann gleichzeitig fachliche Bedenken und persönliche Unsicherheit haben. Für eine passende Maßnahme muss deshalb zuerst geklärt werden, worauf die konkrete Rückmeldung beruht.

Instrumente passend kombinieren

Handlungsfeld	Mögliche Instrumente
Orientierung	Warum und Dringlichkeit erklären; Zielbild, Grenzen sowie Qualitäts- und Datenregeln klären
Beteiligung	Rollenworkshops und Co-Design: Lösungen mit Betroffenen entwickeln; Betriebsrat einbeziehen; Entscheidungen sichtbar zurückmelden
Befähigung	Rollenbezogene Schulung, Übungsumgebung, bezahlte Lernzeit, Coaching (individuelle Begleitung beim Lernen und Lösen von Problemen) und Praxisnachweis
Agile Umsetzung	Pilotzyklus: kurzer Durchlauf aus Erprobung, Auswertung und Anpassung; sichtbares Backlog mit priorisierten offenen Aufgaben; tägliche operative Klärung
Führung	Vorleben, Konflikte klären, delegierte Entscheidungen respektieren und Lernfehler schützen

Handlungsfeld	Mögliche Instrumente
Verstetigung	Bewährte Abläufe in den Regelbetrieb überführen: Prozesseigner (die für den Ablauf verantwortliche Person), Standards, Wiki (gemeinsam gepflegte Wissenssammlung), Onboarding (Einarbeitung neuer Beschäftigter) und Kennzahlen-Review (regelmäßige Auswertung der Messgrößen)

Rollen und Routinen

Ein **Change Agent** unterstützt die Veränderung im Arbeitsalltag und vermittelt Rückmeldungen zwischen Beschäftigten und Projekt. Die Person kann etwa Erfahrungen aus der praktischen Nutzung sammeln und Hindernisse an die zuständige Stelle weitergeben. Sie ersetzt damit weder die Führungskraft noch eine zugesagte Qualifizierung.

Ein **Pilotzyklus** verbindet eine abgegrenzte Erprobung mit ihrer Auswertung und einer anschließenden Anpassung. Das **Backlog** sammelt die offenen Aufgaben, Probleme und Verbesserungen sichtbar und nach Priorität. In der **Retrospektive** betrachtet das Team regelmäßig seine Zusammenarbeit und beschließt konkrete Verbesserungen; eine reine Statusmeldung über erledigte Aufgaben genügt dafür nicht.

Verstetigung überführt bewährte Abläufe in den Regelbetrieb, beispielsweise durch feste Zuständigkeiten, Standards und die Einarbeitung neuer Beschäftigter. Dazu gehört gegebenenfalls die **De-Implementierung des Altprozesses**: Der überholte Ablauf wird nach einer abgesicherten Umstellung bewusst beendet. Sonst können alte Listen und neue Systeme dauerhaft nebeneinander zusätzliche Arbeit erzeugen.

Newsletter (regelmäßige Informationsmitteilungen), Kick-off oder ein neues Werkzeug allein ergeben noch keine Change-Strategie. Entscheidend ist, dass Diagnose, Beteiligung, Befähigung und Umsetzung zusammenpassen.

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Stakeholderkarte

OneNote Stakeholderkarte — □ ×

Start · Einfügen · Zeichnen · Ansicht 100 %

BioCasa GmbH · M4 · Interne Arbeitsunterlage

Stakeholderkarte

Projektleitung an den Change-Lenkungskreis · Stand 21.05.2027. Stakeholder sind Personen oder Gruppen, die von der Veränderung betroffen sind oder sie beeinflussen können. Die **Stakeholderanalyse** betrachtet deshalb Einfluss, Betroffenheit, Haltung und Bedarf zusammen. Eine stark betroffene Gruppe braucht nicht automatisch dieselbe Unterstützung wie eine einflussreiche Entscheidungsinstanz. Die Einschätzungen in der Tabelle sind zu überprüfende Planungsannahmen.

Stakeholder	Einfluss / Betroffenheit	Aktuelle Haltung	Zentraler Bedarf
Gründerteam	hoch / hoch	Grundsätzlich positiv, unterschiedliche Prioritäten	Entscheidungsdisziplin und gemeinsame Botschaft
Künftiger Prozessowner (verantwortlich für den gesamten Ablauf)	hoch / hoch	Positiv, unter Druck	Klare Kompetenz und Rückhalt
Teamleitungen	mittel bis hoch / hoch	Gemischt	Rollen- und Statusklärung
Prozesszelle (Team, das den neuen Ablauf im Pilot gemeinsam erprobt)	mittel / sehr hoch	Gemischt	Qualifikation, Zeit und Rückkehrrecht
Übrige Produktion / Lager	mittel / mittel bis hoch	Skeptisch oder unentschieden	Belastung, Schnittstellen und Nutzen klären
Qualität	hoch bei Freigabe / hoch	Bedingt positiv	Unabhängige Stopprechte
Betriebsrat	mittel bis hoch / hoch	Bedingte Unterstützung	Vereinbarung, Transparenz und Beteiligung
NoordVers (Kunde)	extern hoch / mittel	Erwartungsvoll	Lieferleistung und verlässliche Kommunikation

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien

●●● **SAP S/4HANA** Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien — □ ×

Zurück · Sichern · Weitere 100 %

BioCasa GmbH · M5 · Interne Arbeitsunterlage

Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien

Ressourcen für den Pilot

IT bedeutet Informationstechnik. Ein IT-Personentag bezeichnet den Arbeitsaufwand einer IT-Fachkraft an einem Arbeitstag; zwei gleichzeitig arbeitende Personen benötigen für einen Tag zusammen zwei Personentage.

Ressource	Verfügbarer Rahmen	Einordnung
Gesamtbudget	120.000 Euro	Gemeinsames Projektbudget aus LS08/09
Qualifizierung	Höchstens 18 Personen-Schulungstage je Kalenderwoche	Ein Personen-Schulungstag = acht bezahlte Stunden; dieselbe gemeinsame Grenze wie in LS05
IT-Entwicklung vor Start	25 Personentage	Einmaliges Kontingent für die Vorbereitung
IT-Entwicklung im Pilot	10 Personentage je Pilotmonat	Sechs Pilotmonate vom 15.06. bis 15.12.
Change-Projektleitung	0,5 FTE	Aus bestehender Stelle freigestellt
Change Agents	Sechs Personen mit je 0,1 FTE	Zeitweilige Freistellung aus bestehenden Stellen

FTE = Full-Time Equivalent (Vollzeitäquivalent). FTE misst Arbeitskapazität, nicht die Zahl der Personen. 0,5 FTE entsprechen der Hälfte einer vereinbarten Vollzeitstelle; bei einer Vollzeitwoche von 40 Stunden wären das beispielsweise 20 Stunden. Zwei Personen mit je einer halben Stelle entsprechen zusammen 1,0 FTE. Die Projektanteile im Fall sind Freistellungen aus bestehenden Stellen und keine zusätzliche Personalaufstockung. Vertretung und Engpässe sind im Plan zu berücksichtigen. Ein Pilotmonat reicht in diesem Planungsmodell jeweils vom 15. eines Monats bis zum 14. des Folgemonats.

Rechengrundlagen für Ihren Ressourcenplan

Schulungszeit = Personen-Schulungstage × 8 Stunden
Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10
Projekt-FTE = Leitungs-FTE + Anzahl Agents × FTE je Agent
IT-Personentage = Vorbereitung + Pilotmonate × Monatskontingent

Rechnen Sie mit den angegebenen Daten. Übernehmen Sie die Wochenbelegung aus Ihrem LS05-Plan verbindlich. Wenn Sie LS10 als Einzelpaket ohne LS05-Vorprodukt bearbeiten, legen Sie stattdessen eine begründete vorläufige Annahme zur LS05-Belegung je Kalenderwoche offen. Planen Sie LS10 als zusätzliche Reservierung innerhalb derselben 18 Personen-Schulungstage. Eine positive Reserve ist zunächst nur unter dieser Annahme verfügbar; die endgültige Freigabe erfolgt erst nach dem Abgleich beider Pläne. Ein negativer Rest zeigt eine Überlastung, für die Sie Termine, Gruppen oder Umfang anpassen müssen. Prüfen Sie außerdem die monatliche IT-Grenze und die Freistellungskapazität. Eine Geldsumme lässt sich aus Personentagen erst mit einem belegten oder offengelegten Kostensatz ableiten.

Termine und Messgrößen

Meilenstein	Termin
Pilotstart	15.06.2027
Monatsreviews	Monatlich während des Piloten
Halbzeitreview	15.09.2027
Verstetigungsentscheid	15.12.2027

Die Durchlaufzeit misst die Dauer vom Beginn bis zum Abschluss des betrachteten Auftragsprozesses. Ausgangswerte: **5,8 Tage Durchlaufzeit** und **7,0 % verspätete Aufträge**. Prozessziele aus LS08: höchstens 3,5 Tage und höchstens 2 %. Ergänzen Sie begründete Ziele für Fehler/Nacharbeit, Überstunden/Belastung, Schulungs- und Praxistestquote, offene Prozesshindernisse, Vertrauen in die Datennutzung und Mitarbeiterfeedback. Geben Sie bei jeder Quote an, was gezählt wird und worauf sich der Anteil bezieht, zum Beispiel erfolgreich absolvierte Praxistests im Verhältnis zu den zu qualifizierenden Personen.

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Kommunikations- und Beteiligungskanäle

Outlook Kommunikations- und Beteiligungskanäle — □ ×

Antworten · Weiterleiten · Löschen 100 %

BioCasa GmbH · M6 · Interne Arbeitsunterlage

Kommunikations- und Beteiligungskanäle

Von: Julia de Buhr · HR

An: Planungsteam Change

Julia de Buhr und HR (Human Resources, der Personalbereich) an das Planungsteam · 21.05.2027. Die folgenden Kanäle stehen zur Auswahl. Zeiten sind Richtwerte pro Termin, keine zusätzliche verbindliche Terminplanung.

Kanal	Geeignet für	Aufwand und Zugang
Präsenz-Kick-off	Gemeinsames Ziel, Leitplanken und Rückfragen aller Betroffenen	60 Minuten; für beide Schichten wiederholen
Schicht-Huddle	Kurze operative Klärung von Tagesproblemen und Übergaben	10 Minuten; beide Schichten gleich informieren
FAQ / Intranet	FAQ (Frequently Asked Questions) sammeln Antworten auf häufige Fragen. Das Intranet ist das interne Informationsnetz des Unternehmens	Laufende Pflege; Bildschirmzugang in Arbeitszeit nötig
Offene Sprechstunde	Intensiver Dialog über Unsicherheit und Einzelfragen	30 Minuten; wechselnde Termine für Schicht und Teilzeit
Rollenworkshop	Gemeinsame Arbeit an Befugnissen und Schnittstellen, also den Übergaben zwischen Aufgaben oder Bereichen	90 Minuten; Vertretung erforderlich
Digitale Fragebox	Zeitversetzt Fragen sammeln und Antworten nachvollziehbar machen	Wöchentliche Bearbeitung; keine Namen in öffentlicher Ansicht
Lernplattform	Vorbereitung, Übung und Rückmeldung	Zeit je Einheit planen; bezahlte Lernzeit und Geräte nötig
1:1-Gespräch (Gespräch zwischen zwei Personen)	Vertrauliche Rollen-, Status- oder Lernfragen	30 Minuten; kein Ersatz für kollektiv vereinbarte Regeln
Betriebsversammlung	Gemeinsame Beschäftigteninteressen, Fragen und Diskussion	Im zuständigen Gremium planen; Produktion abstimmen
Wöchentliche Retrospektive	Hindernisse gemeinsam auswerten und Zusammenarbeit anpassen	30 Minuten; Schichtvertretung einbeziehen
Monatlicher Lenkungskreis	Ressourcen, Risiken und Fortführung entscheiden	60 Minuten; Ergebnisse transparent zurückmelden

Keine private WhatsApp-Gruppe als offizieller Pflichtkanal. Berücksichtigen Sie Reichweite, Dialogmöglichkeit, Vertraulichkeit und tatsächlichen Zugang in der Arbeitszeit.

Ein **Schicht-Huddle** ist eine kurze operative Besprechung: Die Beteiligten klären aktuelle Probleme und Übergaben für die anstehende Arbeit. Die **Retrospektive** blickt dagegen auf die Zusammenarbeit über einen Zeitraum zurück und führt zu Verbesserungsbeschlüssen. Beide Formate dienen dem Dialog, bearbeiten aber unterschiedliche Fragen.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Methodenkarte „Maßnahmenplan“

OneNote Methodenkarte „Maßnahmenplan“ — □ ×

Start · Einfügen · Zeichnen · Ansicht 100 %

BioCasa GmbH · M7 · Interne Arbeitsunterlage

Methodenkarte „Maßnahmenplan“

Der Maßnahmenplan verknüpft die Ist-Analyse mit konkretem Handeln und einem überprüfbaren Ziel. Er soll im Betrieb als gemeinsame Arbeitsgrundlage nutzbar sein.

Baustein	Inhalt
Thema / Ausgangssituation	Welches Problem wird auf Grundlage welcher Fakten bearbeitet?
Zielsetzung	Welcher messbare Zustand soll erreicht werden?
Was – Wer – Wie	Welche begründete Maßnahme wird von wem und auf welche Weise umgesetzt?
Wann / Zielgruppe	Termin, Dauer und betroffene Stakeholder beziehungsweise Widerstandsursache
Ressource	Benötigte Zeit, Personal und Budget; Berechnung beziehungsweise Annahme angeben
Wirkung / Nachweis	Erwartete Wirkung, Kennzahl und überprüfbarer Beleg
Abhängigkeit / Stopppunkt	Was muss vorher erfüllt sein? Wann wird angepasst oder gestoppt?

Begründen Sie Prioritäten. Eine lange Liste ersetzt keinen durchführbaren Plan. Unterscheiden Sie vorhandene Falldaten von eigenen Planungsannahmen.

Grundlage: die im Lernpaket vorgegebenen Anforderungen an das Handlungsergebnis „Maßnahmenplan“; betriebliche Ergänzungen für BioCasa.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

CHANGEPROZESSE GESTALTEN

Lessons Learned „WMS-Test 2026“

OneNote Lessons Learned „WMS-Test 2026“ — □ ×

Start · Einfügen · Zeichnen · Ansicht 100 %

BioCasa GmbH · M8 · Interne Arbeitsunterlage

Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Interne Lernnotiz aus dem WMS-Test 2026. WMS bedeutet Warehouse Management System, also Software für Lagerabläufe. **Lessons Learned** sind systematisch festgehaltene Erkenntnisse aus früheren Erfahrungen, die künftiges Handeln verbessern sollen. Eine bloße Beobachtung wird dafür ausgewertet: Was hat zum Ergebnis beigetragen und welche Konsequenz folgt für das nächste Vorhaben? Die Rückschau dient dem Lernen und nicht der Schuldzuweisung.

Beobachtete Schwierigkeiten

Beobachtung	Für die neue Planung zu untersuchen
Das Werkzeug wurde vor der Prozessklärung eingeführt.	Welche Abläufe und Zuständigkeiten müssen vor dem Einsatz geklärt sein?
Schulung erreichte nur die Tagschicht.	Wie erhalten alle betroffenen Schichten und Teilzeitkräfte Zugang?
Fragen blieben ohne sichtbare Antwort.	Wie werden Antworten und Entscheidungen nachvollziehbar zurückgemeldet?
Führungskräfte führten parallel private Excel-Listen.	Wie wird ein verbindlicher Datenstand eingehalten?
Fehler wurden einzelnen Personen zugerechnet.	Wie werden Lernfehler und tatsächliche Risiken differenziert bearbeitet?
Der Altprozess blieb dauerhaft bestehen.	Welche Bedingungen und Termine sind für seine sichere Abschaltung nötig?

Nützliche Erfahrungen

- Zwei Lagerkräfte unterstützten Kolleginnen und Kollegen informell bei der Nutzung.
- Eine tägliche Klärung von zehn Minuten verringerte die Zahl offener Fehler.

Leiten Sie begründete Maßnahmen aus den Erfahrungen ab. Prüfen Sie dabei, welche Ursache jeweils vorliegt; mehr Kommunikation allein löst nicht jedes Problem.
BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027
